01 このメモでやりたいこと

塾サイトの制作を、初期費用の中で、品質を落とさずに1案件12時間で回せる形にしたい。そのために「どこを変えれば楽になるか」を、ポパー Slack の実案件（2026年5月〜10月、22件）から整理しました。

1 今の数字

目標（佐久間さん見込み）
10 ～12 h
カイカ稼働・1案件

実感値
20 ～30 h
目標の2倍

初期費用で賄える上限
39 h
98,000円 ÷ 2,500円

キックオフ→公開
49 ～107日
目標45日。9月の公開は0件

初稿後の修正往復
3 ～4回
目標2回。多いと6回

10月の新規受注
6 件
受注が先に増えている

2 差分の正体と、やってみたいこと

差分の約10時間は、作業そのものではなく「ずれの調整」に消えています。塾側で考えが動くこと、ビットスターが塾と直接会わないので雰囲気が初稿に乗らないこと、そのずれを岡部さん・井口さんが往復で埋めていること。この3つが主因です（根拠は6〜7ページ）。

やってみたいこと① 「ここまで」を決める
5ページ・修正2往復・塾の素材提出は2週間以内。超えた分はオプションに。営業資料と契約書に同じ言葉で

やってみたいこと② ビットスターにキックオフへ来てもらう
塾長と直接話して、雰囲気と参考サイトをその場で決める。ずれの元を最初に潰す

やってみたいこと③ 「それは範囲外」と言う人を決める
槻山さんにお願いしたい。あわせて、カイカ2名の同時案件数とビットスター窓口の負荷に上限を

※ 高嶌（カイカ）が書いた叩き台です。一緒に決めたいことは11ページにまとめています

3 このメモの読み方と前提

2〜5ページ：今の姿
流れ、分担、やる人と決める人、数字。ここは事実だけを並べています。

6〜7ページ：引っかかりと原因
範囲・役割・仕組み・体制の4つの切り口と、工程別の時間。根拠は Slack の発言と案件の経過。

8〜9ページ：やれそうなこと
効果とやりやすさで並べた13の手と、「ここまで」の案、変えたあとの流れ。

10〜11ページ：進め方と決めたいこと
11月〜1月の進め方、見る数字、気になっていること、一緒に決めたい9項目。出典と前提は最終ページ。

ひとこと｜ **流れも顔ぶれも変えなくていい。「どこまで」「誰が止めるか」「ビットスターとの接点」「同時に何件か」を決め直せば、12時間は見えてくる**

02 今の流れ（6ステップ）

ポパーが商談で条件を説明して契約を結び、そこからキックオフへ。以降の進行はカイカが前に立ち、やり取りにはポパーの担当がいつも一緒にいる、という形で動いています。

POPER
セールス
商談で制約・条件（スコープ、料金、期間、塾側の作業）を説明

→

POPER
契約
契約書を締結してから初回ミーティングの日程を調整

→

POPER + CAICA
キックオフ 60〜90分
佐久間さん→槻山さんへ引き継ぎ。岡部さん・井口さんがヒアリング

→

CAICA 岡部
方向性・ワイヤー
デザインの方向性を具体化し、構成案に落としてビットスターへ発注

→

CAICA 井口
初稿チェック・修正往復
初稿を確認して塾へ展開。リマインドは2回目以降も担当。目標2往復・実態3〜4往復

→

ALL
納品
公開前チェック、公開、切替案内、GA設置、月額課金開始

やり取りの決まりごと
塾・ビットスターとのテキストのやり取りには、ポパー側（佐久間さん・槻山さん）がいつも入っていて、実際に手を動かすのはカイカ側（主に井口さん）。

カイカが持つところ
構成から納品までの進行。塾へのリマインドは2回目以降もカイカがやる（ここはポパーの希望どおりで）。引っかかっているのは「誰がリマインドするか」ではなく、「何往復まで・何ページまで・素材が来なかったらどうするか」が決まっていないこと。

情報の置き場が工程ごとに違う
ヒアリングフォーム（ビットスター製）、入力フォーマット、構成案、修正指示（3形式）、顧客Slack、#bitstar_制作関連。9/4 にビットスターの今地さんから「情報源が分散しており、漏れが発生しやすく」と指摘があり、以後は構成案を正とする運用に寄せています。

ひとこと｜ **流れと役割はもう整っている。決まっていないのは「初期費用でどこまでやるか」と「それ以上を誰が止めるか」の2つだけ**

03 ステップごとに、誰が何を持っているか

今の分担を表にしました。カイカは「岡部さん＝ディレクション、井口さん＝制作進行」で分けています。

フェーズ	ポパー	岡部さん（ディレクション）	井口さん（制作進行）	ビットスター	塾
1 セールス	佐久間さん（→下田さん）が商談。SF 登録	—	—	—	要望を話す
2 契約	根本さんが法務へ→クラウドサイン。顧客 Slack 開設。個別発注（石橋さん）	—	—	発注受領	署名
3 キックオフ	槻山さんが窓口。契約内容確認、コピー案	ヒアリング（方向性）	ヒアリング（素材・期限）	不参加	希望・素材状況
4 ワイヤー	コピー確認（佐久間さん）	構成案（Google ドキュメント／スライド）	—	構成案受領→制作	構成案確認
5 初稿〜修正	やり取りに同席（cc）	デザイン判断を相談されたら回答	初稿チェック、塾展開、リマインド、修正指示	初稿5営業日、修正（上限6回）	確認・修正依頼
6 納品	請求開始、GA 設置（移行中）	納品後チェック、事例記事	公開前チェック、切替案内	公開	塾側作業

みんなの気になりどころ
佐久間さん：採算、プラン設計、案件数（商談は10月下旬から下田さんへ移管中）／槻山さん：調整工数の増加、ビットスターとの条件、契約条項／岡部さん・井口さん：修正往復、塾の停滞、情報の分散／ビットスター高山さん・今地さん：情報の正本、修正回数、プラン範囲／塾長：教室の雰囲気が伝わるサイト、早い公開

今使っているツール
調整アポ、SF（商談・売上見込）、#comirusupport_コミサポβ（受注・契約・請求）、クラウドサイン、ビットスター個別発注ワークフロー、入力フォーマット（スプレッドシート）、構成案（Google ドキュメント／スライド）、修正指示（ドキュメント／スライド／スプレッドシート青字／Dropbox）、顧客別 Slack、#bitstar_制作関連（案件ごとのスレッド）、案件管理スプレッドシート（SF 自動転記）、Vercel テスト URL

ひとこと｜ **誰が何をやるかははっきりしている。ビットスターがキックオフにいないこと、修正往復に上限がないこと、がこの先の話**

04 「やる人」と「決める人」の整理

やる人はステップごとにはっきりしています。ただ「それは範囲外です」と決める人だけ、誰にも置かれていません。

工程	佐久間・下田	槻山	根本・法務	岡部・井口	ビットスター	塾
営業・受注	やる・決める	cc	cc	cc	—	相談
契約書・請求	決める	相談	やる	cc	cc	相談
キックオフ	やる	やる・決める	—	やる	—	相談
方向性・ワイヤー・コピー	相談	相談	—	やる・決める（岡部）	cc	相談
初稿チェック・修正往復	cc	cc	—	やる・決める（井口）	やる	相談
塾への催促（2回目以降含む）	cc	cc	—	やる（井口）	—	—
公開・納品	—	相談	—	やる	やる	相談
スコープ外の判断	（いない）	相談	—	相談	—	—
GA・事例・請求開始	決める	やる	やる	やる（事例）	cc	cc

やる＝手を動かす　決める＝最終的に判断する　相談＝聞かれたら答える　cc＝見ている。塗りのある欄が「やる」。

見えてきたこと
3往復目・ページ追加・仕様変更が出たときに「これは初期費用の外ですね」と言う人が決まっていない。なので、カイカは判断を持たないまま往復を続けることになっている。

役割の原案（佐久間さん 5/28）
営業：佐久間／マーケコンサル：佐久間 or 槻山／構成：岡部／制作ディレクション：岡部／進行・修正：井口。井口さんも 8/20 に「岡部さんに構成→初稿まで、初稿から納品までを井口で」と提案しており、実態はこれに近い。

ひとこと｜ **空いているのは1か所だけ。「範囲外」を決める人がいれば、カイカは「3往復目です」と報告するだけで済む**

05 数字で見ると

初期費用98,000円（税抜）だと、カイカの稼働は39時間が上限です。実感値の20〜30時間では、半額の案件は赤字になります。

顧客 初期費用（標準）
98,000 円
値引き例 49,000 / 29,000 / 0円

顧客 月額（2年契約）
9,800 円
サーバー・ドメイン・保守込み

ビットスター 月額
6,800 円
プレミアプラン・初期0円

カイカ 時給
2,500 円
岡部さん・井口さん

初期費用で賄える上限
39 h
98,000 ÷ 2,500

月額側の2年粗利
72,000 円
(9,800−6,800)×24か月


1 目標と今の差

指標	目標	現状	根拠
カイカ稼働／案件	10〜12 h	20〜30 h	9月申告38h ÷ 4〜5件 × 2〜3か月
カイカ費用／初期費用	≦30%	50〜77%	半額案件では100%超
キックオフ→公開	45日	49〜107日	未公開3件は90日超
初稿後の修正往復	2回	3〜4回	プラン上限6回に達する案件あり

2 カイカの稼働時間ごとに、初期費用がいくら残るか（税抜・目安）

カイカ稼働	カイカ費用	98,000円案件	49,000円案件	評価
12 h	30,000	68,000	19,000	目標上限
20 h	50,000	48,000	−1,000	半額案件は赤字
30 h	75,000	23,000	−26,000	実感値の上限
39 h	**97,500**	**500**	**−48,500**	**初期費用を使い切る**

3 キックオフから公開までにかかった日数（わかった分）

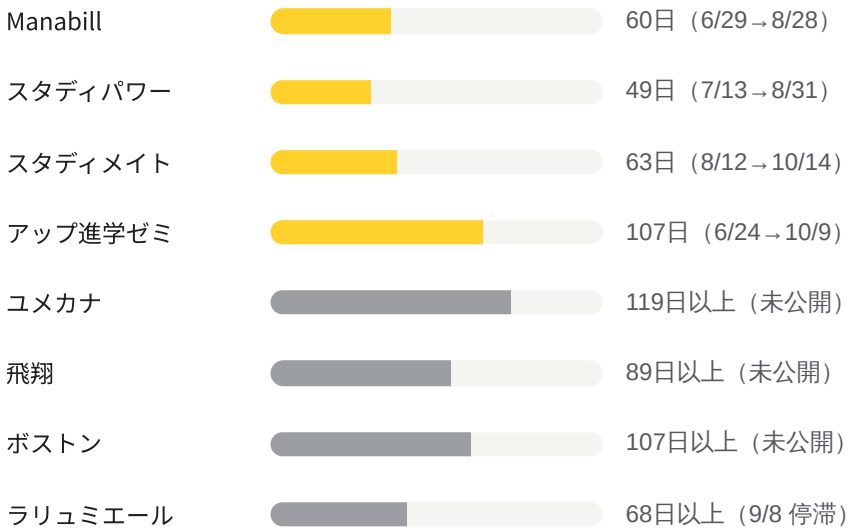

※ 灰色は10月28日時点で未公開。目標45日を満たした案件はない。ビットスターへの支払いは公開翌月1日起算のため、公開が遅れるほど月額収入も遅れる。初期費用の値引きや稼働超過は、月額粗利72,000円で2年かけて回収する構造

ひとこと｜ **時間も日数も目標の2倍。値引き案件は20時間で赤字になるので、「どこまで」を決めないと採算が読めない**

06 引っかかっているところ（範囲・役割・仕組み・体制）

顔ぶれと流れはそのままに、「この流れの中で時間を押し上げているもの」を4つの切り口で洗い出してみました。

観点	課題	実案件での現れ方	どの手で扱うか（8ページ）
関わる範囲	初期費用に含む範囲（ページ数・修正往復・素材の期限）が決まっていない	修正が3〜4往復、多いと6往復。アップ進学ゼミは「修正回数×2」でプラン上限へ	①標準スコープ
	塾側の素材提出に期限がなく、待ちの間もカイカの進行が続く	夏期講習で原稿が止まる（アップ進学ゼミ）。初稿後に返事が来ない（まなサポ、ラリュミエール、ボストン）	①標準スコープ、⑤仮サイト先行
	値引き案件でも同じ範囲を提供している	初期49,000円・29,000円・0円の案件が増加。20時間で初期費用を使い切る	①（値引き時の範囲）
役割分担	スコープ外（3往復目、ページ追加、仕様変更）を判断する人が決まっていない	カイカが判断を持たないまま往復を続ける。V-follows は初稿後にロゴ・表記変更	④判断者と報告ルート
	セールスで説明する条件と、キックオフで塾が聞く条件がずれる	ブログ移行40,000円が営業時に漏れる（スタディパワー）。槻山さん「営業時にやるの漏れそう」	①（商談で提示）
	岡部さん・井口さんの分担はあるが、案件ごとの引き継ぎ点が明文化されていない	キックオフにどちらか1名のみ参加する案件があり、井口さんが 8/20 に2名参加を提案	④、⑥テンプレート
仕組み	ビットスターが塾と直接の接点を持たず、文字情報だけで制作する	塾長の人柄・教室の雰囲気が初稿に乗らず、岡部さん・井口さんが素材を集め直して伝え直す	②ビットスター同席
	情報の正本が複数あり、反映漏れと「見ていない」の応酬になる	岡部さん 9/2「支給したテキストでなく別のものが入っており」。今地さん 9/4「情報源が分散」	③正本の一本化
	塾側で方向が動くことを前提にした工程になっていない	言語化が苦手な先生、理想が高い先生で修正が止まらない。まなサポ「かわいいサイト」の後出し	②同席、①修正往復の上限
体制	ポパー側の調整が槻山さん1人に集中している	槻山さん 10/28「納品早めるのに MTG 増えて、調整工数が増えてきました」	⑦体制
	ビットスター側の窓口が高山さん1人で、休暇や多忙で待ちが出る	10/26〜27 の休暇で待ち。定例（水17時）は形骸化し解除提案	⑦体制（窓口の副担当）
	カイカ2名の同時案件数に上限がなく、受注が先に増えている	10月だけで新規6件。岡部さんの9月稼働は約38時間、同時に4〜5件	⑦体制、⑧稼働記録

ひとこと｜ **12個のうち、範囲と役割の6個は「決めれば解ける」。仕組みの3個はビットスター同席と資料の一本化で、体制の3個は上限を置くことで**

07 なぜ12時間に収まらないのか

順調に進めば13.5時間、実案件に近いと29時間。差の15.5時間は「手戻り」「待ちと催促」「公開まわり」で生まれています。

A 作業そのものの量　順調で約8h

- キックオフ同席1.5h、ヒアリング整理1.5h、構成案4h、発注・初稿確認1h。目標内に収まる。
  - 根拠：岡部さん 10/9「構成案を作成しております。全体で6ページ」。STERA・幸彩・西沢の構成案はいずれも1〜2日で提出

B 手戻り（修正往復）　3h → 8h

- **塾側で方向が動く。**言語化が苦手な先生は「なんとなく違う」としか言えず、理想が高い先生は「もっと良くしたい」が止まらない。
- **ビットスターが塾と直接会わない。**文字情報だけで制作するため雰囲気が初稿に乗らず、岡部さん・井口さんが素材を集め直して伝え直す。**情報の正本も複数**で、反映漏れと「見ていない」の応酬になる。
  - 根拠：槻山さん 8/24「まじで修正のラリーが多い」。井口さん 9/7「修正の量やばw」。岡部さん 9/2「支給したテキストでなく全く別のものが入っており」。今地さん 9/4「情報源が分散」

C 待ちと催促　0.5h → 3h

- 原稿・写真が揃わない。初稿後に返事が来ない。待つ間のリマインドと再開時の再確認。
  - 根拠：アップ進学ゼミ（夏期講習で原稿遅延、6/24→10/9）。槻山さん 9/29「初稿出してるのに止まってる案件：まなサポ、佐分利、ボストン」

D 公開まわりの周辺作業　2h → 5h

- 公開前チェック、切替案内、契約条件の確認、計測の設置。塾側作業の案内と確認に時間がかかる。細部には立ち入らず、範囲を決める対象として扱う。
  - 根拠：アップ進学ゼミ・V-follows・スタディメイトで公開後の切替に往復。GA はポパー側へ移行中（10/20）

工程	枝	順調	実態	増える理由
キックオフ同席・議事	A	1.5	2.0	2名同席、日程再調整
ヒアリング整理・コピー確認	A/C	1.5	3.0	原稿が揃わず再ヒアリング
構成案（ワイヤー）作成	A	4.0	6.0	既存サイト再現、参考サイト調査
発注・初稿確認	A/B	1.0	2.0	反映漏れの洗い出し
塾確認・修正指示（1往復1〜1.5h）	B	3.0	8.0	2往復か、3〜4往復か、6往復か
塾への催促（2回目以降含む）・MTG	C	0.5	3.0	初稿後の停滞
公開・切替案内	D	1.0	3.0	塾側作業の案内と確認
納品後チェック・GA・事例	D	1.0	2.0	GA はポパー側へ移行中
合計		**13.5**	**29.0**	**B・C・D で15.5時間増える**

高嶌の見立て
見込み10〜12時間と実感値20時間前後の差は、作業量の見積もり違いではなく、①塾側で考えが動くこと、②ビットスターが塾と直接会っていないこと、この2つの調整に使われています。①は「ここまで」と期限で、②はビットスターのキックオフ同席で縮められます。

ひとこと｜ **順調でも13.5時間。12時間は、「ここまで」を決めたうえで B〜D を削って、やっと届く数字**

08 やれそうなことと、順番

効果（削れる時間）とやりやすさで並べました。塗りのあるところから手を付けます。①〜⑥を合わせると、実態29時間から12時間圏内に入る計算です（重複分は割り引いて）。

効果 大 × すぐできる（まずやる）

- **①標準スコープの明文化**：5ページ・修正2往復・塾の提出期限・オプション価格
- **②ビットスターのキックオフ同席**：高山さんが60〜90分参加し、雰囲気と参考サイトをその場で合意
- **③情報の正本を構成案1つに**：フォーム廃止、修正指示も1形式

効果 大 × 準備が要る（次にやる）

- **④スコープ外の判断者と報告ルート**：槻山さんが A、カイカは「3往復目です」と検知して報告
- **⑤仮サイト先行の二段構え**：宇宙叶Q で初適用。「仮サイト中は修正なし」の説明
- **⑥構成案テンプレート**：定型7ページとヒアリング項目を固定
- **⑦体制**：カイカ2名の同時案件数に上限、ビットスター窓口に副担当

効果 小 × すぐできる（ついでにやる）

- ⑧初稿の標準仕様4点（10/21 槻山さん、依頼済み）
- ⑨修正戻し2営業日の取り決め（回答待ち）
- ⑩GA・GTM・サチコをポパー計測アカウントで設置
- ⑪キックオフでスケジュール固定（V-follows で実施）

効果 小 × 準備が要る（保留）

- ⑫AI 内製への切り替え（8/24 テスト。未評価）
- ⑬案件固定フィー化（判断者が決まってから）

打ち手	枝	削減見込み	前提・コスト	決める人
①標準スコープ	B・C	−5〜8 h	営業資料と契約書に同じ文言。期限超過は仮サイトで公開	佐久間さん・槻山さん
②ビットスター同席	B	−3〜5 h	ビットスターの工数。プラン外なら費用。高山さんの日程	佐久間さん、槻山さん
③正本の一本化	B	−1〜2 h	修正指示の書式をビットスターと合意	槻山さん・岡部さん
④判断者と報告ルート	B・C	−3〜5 h	3往復目で止める判断を槻山さんが持つ	佐久間さん・槻山さん
⑤仮サイト先行	C	−2〜3 h	公開翌月から月額課金が始まる利点	佐久間さん
⑥構成案テンプレ	A	−2 h	AI 感への懸念と両立（佐久間さん 6/24 方針）	岡部さん
⑦体制	—	待ち時間の削減	同時案件数の上限、窓口の副担当。納期に効く	佐久間さん・高嶌
①〜⑥の合計		**−16〜25 h**	**実態29h → 4〜13h。重複を割り引いても12時間圏内**	

※ 削れる時間は推定です。11〜12月に3案件で試して、実測に置き換えます

ひとこと｜ **まず①②③から。④⑤⑥⑦は11月中に準備して、12月末の実測で続けるか決める**

09 こう変えたい

新しい条件を増やすというより、契約書に入り始めた条項とビットスターのプラン上限を、営業とキックオフの段階で先に言っておく、という整理です。

1 「ここまで」の案

初期費用に含む
キックオフ60〜90分（ビットスター同席）、ヒアリング整理、構成案（5ページまで）、初稿確認、修正2往復、リマインド（回数制限なし）、公開前チェック、公開時の切替案内

塾の責任
原稿・写真・ロゴをキックオフから2週間以内に提出。確認の返事は5営業日以内。期限を過ぎた場合は仮サイトで公開し、以後は月3回の保守枠で修正

オプション（別料金）
修正3往復目以降、ページ追加、ブログ移行（10,000〜40,000円）、ドメイン移管の代行（15,000円）、ロゴ制作（20,000円）、画像・イラスト6点目以降

2 変えたあとの流れ（変わるところは赤字）

POPER
セールス
標準スコープとオプションを商談で提示
→
POPER
契約
条項をスコープと一致
→
POPER + CAICA + BITSTAR
キックオフ
ビットスター同席、スケジュール固定
→
CAICA 岡部
ワイヤー
テンプレート化、正本は構成案のみ
→
CAICA 井口
初稿〜修正2往復
リマインドは現状どおり。3往復目は槻山さんへ報告
→
ALL
納品
塾側作業の案内文を定型化。計測はポパーアカウント

工程	佐久間・下田	槻山	根本・法務	岡部・井口	ビットスター	塾	現状との違い
営業・受注	やる・決める	相談	cc	cc	—	相談	標準スコープとオプションを商談で提示
キックオフ	やる	やる・決める	—	やる	やる	相談	ビットスター同席、スケジュール固定
初稿・修正（2往復）	cc	cc	—	やる・決める	やる	相談	修正指示は1形式
塾への催促（2回目以降含む）	cc	cc	—	やる（井口）	—	—	現状どおり。期限超過時の扱い（仮サイト公開）を先に決める
スコープ外の判断	決める	やる	—	相談（気づいたら報告）	—	—	決める人を置く。カイカは「3往復目です」と報告するだけ

ひとこと｜ **変えるのは4つ。商談で「ここまで」を言う、ビットスター同席、資料の一本化、「範囲外」を決める人**

10 進め方と、見る数字

11月に決めて測り始め、11〜12月の3案件で試して、12月末に実測で判断。佐久間さんの「年内に意見がほしい」に合わせています。

11月
決めて、測り始める
標準スコープの文言を確定（営業資料・契約書）／ビットスターに同席と戻し2営業日を打診／工程別の稼働記録を開始（8区分）／修正指示の書式を1つに

→

11〜12月
3案件で試行
ゼロプラス、早稲田トップスクール、ECC 川口（または次の新規）で To-Be を適用／ビットスター同席あり・なしを比較／仮サイト先行は宇宙叶Q の結果を見る

→

12月末
実測で判断
3案件の実測稼働と修正往復数を確認／12時間に収まる条件を特定／判断者と報告ルート（④）の定着、体制（⑦）と固定フィー化（⑬）を判断

→

1月〜
標準運用
下田さんの商談から標準スコープで受注／月次で KPI を確認（案件管理スプレッドシートに列を追加）

KPI	目標	測り方	記録する人
カイカ稼働／案件	≦12 h	工程別8区分で案件ごとに記録。月次申告と突合	岡部さん・井口さん
キックオフ→公開	≦45日	案件管理スプレッドシートにキックオフ日と公開日	槻山さん
初稿後の修正往復	≦2回	ビットスターの「修正 n/6」カウント	岡部さん・井口さん
塾の提出期限遵守	2週間以内	キックオフ日と素材受領日	井口さん
カイカ費用／初期費用	≦30%	稼働 × 2,500 ÷ 初期費用	高嶌（月次）
スコープ外の発生件数	記録のみ	3往復目・ページ追加・仕様変更を検知して報告	岡部さん・井口さん

! 気になっていること

槻山さん・高山さんへの集中が先に限界を迎える
④で判断を槻山さんに置くと判断の件数も増える。判断の基準（標準スコープ）を文章にして、都度の相談を減らす。

ビットスターが同席や戻し日数に応じない
定例は形骸化、高山さん1人に集中。同席がプラン外の費用なら、カイカ稼働5時間減（12,500円）が上限の目安。

標準スコープが値引き案件と合わない
初期49,000円・29,000円・0円が続く。範囲を縮めるか、月額粗利（2年で72,000円）で回収するかを案件ごとに決める。

※「期限超過は仮サイトで公開」は商談で言わないと、キックオフで初めて聞いた塾は反発する。テンプレートは構成だけに留め、写真・コピーで個性を出す

ひとこと｜ **推定を実測に置き換えるのが12月末。そこで決めて、1月からふつうの運用に**

11 一緒に決めたいこと

決めたいこと、選択肢、高嶌の考え、決める人、いつまでに。「高嶌の考え」はあくまで叩き台なので、ひっくり返してもらって大丈夫です。

#	決めたいこと	選択肢	高嶌の考え	決める人	いつまでに
1	**「12時間」の定義**	標準スコープ内の稼働／塾起因の遅延も含む総稼働	前者。総稼働は KPI として別に追う	佐久間さん	打ち合わせ当日
2	**「ここまで」の文言**	9ページの案をそのまま／ページ数・往復数を変える	9ページの案で11月から試行	佐久間さん・槻山さん	11月中旬
3	**ビットスターのキックオフ同席**	全案件／試行3件／やらない	試行3件。費用はカイカ稼働減の範囲（12,500円）まで	佐久間さん（費用）、槻山さん（打診）	11月中旬
4	**「範囲外」を決める人と報告の流れ**	槻山さんが判断／佐久間さんが判断／カイカが塾に直接言う	槻山さんが判断。カイカは検知して報告、塾への説明はポパー	佐久間さん・槻山さん	11月中旬
5	**値引き案件の「ここまで」**	同じ／縮める／カイカ稼働上限を初期費用の7割に	カイカ稼働の上限を置く（98,000円なら27h、49,000円なら14h）	佐久間さん	12月末
6	**仮サイト先行を標準にするか**	宇宙叶Q の結果を待つ／次案件から全件	結果を待つ。12月に判断	佐久間さん	12月末
7	**ビットスターへの依頼事項の回答期限**	戻し2営業日、初稿標準仕様、画像超過単価、解約時費用、公開切替の場合分け表	11月中旬を期限に槻山さんから	槻山さん	11月中旬
8	**稼働記録の開始**	8区分で案件別／月次合計のみ	8区分。11月の新規2案件から	岡部さん・井口さん	11月1日
9	**体制の上限**	カイカ2名の同時案件数（例：1人4件）／ビットスター窓口の副担当／現状維持	同時案件数に上限を置き、超える分は着手日をずらす。ビットスターには副担当を依頼	佐久間さん・高嶌	12月末

ひとこと｜ **11月中旬までに1〜4と7〜8が決まれば、12月末の実測で5・6・9を決められる**

コミサポ　塾サイト制作、どうすれば12時間で回せるか（相談用メモ）

参考メモ

参考　案件一覧（2026年5月〜10月、Slack でわかった範囲）

塾	担当	キックオフ	公開・状態	初期費用（税抜）	メモ
読解アルゴ塾（桜進学会）	佐久間・槻山	5月	公開済、9月から月額	—	第1号案件
YOU-YOU スクール	佐久間	5月	公開済	—	イラスト10種をプレミアム内で
学習塾 MINORIA	槻山	6月	9/1 公開	—	英検会場のため納期固定
Manabill（高松商事）	岡部	6/29	8/28 公開	98,000	事例記事あり
スタディパワー	槻山	7/13	8/31 公開	98,000	ブログ移行40,000円の扱い
アップ進学ゼミ	井口	6/24	10/9 初納品	—	夏期講習で原稿遅延
ユメカナ（ミライ塾）	井口	7/1	未公開（修正中）	98,000	
飛翔（鳥取）	井口	7/31	未公開	—	9月に修正多数
学習塾 Roots from BOSTON	井口	7/13	未公開（停滞）	118,000→49,000	個人契約と法人契約の不整合
スタディメイト	岡部	8/12	10/14 納品	—	旧サイト削除不可
ラリュミエール高等学院	岡部	8/21	9/8 で停滞	49,000	初稿で未確定13項目
まなサポ	岡部	8/13	停滞	—	初稿後に返事なし
かしわや学習会	井口	9/8	受注前ロスト	29,000	塾閉鎖の可能性
幸彩学習塾	岡部	10/6	制作中	—	
西沢学習塾	岡部	10/8	制作中（10/23 第一版）	—	IG サンプルも依頼
V-follows アツギトレリス校	岡部	10/8	修正3/6（11/15 切替目標）	—	既存サイト再現
宇宙叶Q（中桐まどか様）	岡部・井口	10/26	仮サイト12月、本サイト2027年3月	49,000	二段構えの初適用
STERA（2サイト）	岡部	10/21	構成案作成中	68,000×2	FC 脱退サイトと新塾サイト
ECC ベストワン川口校	下田・佐久間	—	10/22 受注	0	月額9,800円、2年後買取49,000円
ゼロプラス（京都）	下田	—	10/28 受注	48,000	12月末完成希望
早稲田トップスクール	佐久間	10/27	仮受注	—	契約書未締結
蛍雪ゼミナール	佐久間→井口	—	見積依頼	—	2027年3月、企業サイト＋塾サイト

※ 初期費用は Slack に記載のあった案件のみ。「—」は未確認。ビットスターへの支払いはプレミアプラン月額6,800円（初期0円）が基本

参考 みんなの言葉（ポパー Slack、原文）と、このメモの前提

> 【役割イメージ】※案件数により様子見ながら 営業：佐久間（天神）／マーケコンサル：佐久間 or 槻山／構成：岡部／制作ディレクション：岡部／進行・修正：井口
> 佐久間さん 2026年5月28日 #サイト制作ディレクション

> 今後のサイト制作の方針 AI感はなくすためにはテンプレが必要／テンプレをつくるのに実案件を回してそれを汎用化する形でテンプレ化する／が、スピード優先するとAI感は出るのでそこは認識の上、顧客の期待値調整をする
> 佐久間さん 2026年6月24日（ビットスター定例メモ）

> サイトのキックオフですが、現在岡部さんか私のどちらかで参加しているのですが、できる限り2人で参加し、岡部さんに構成→初稿まで、初稿から納品までを井口で担当させていただければと思いますが、よろしいでしょうか…？
> 井口さん 2026年8月20日

> あとはまじで修正のラリーが多いので（すみません）現場としては速さと内容含めたやりやすさを気にしています
> 槻山さん 2026年8月24日

> ヒアリングフォーム、ワイヤーフレーム、AI画像資料、現サイトと情報源が分散しており、漏れが発生しやすく
> ビットスター 今地さん 2026年9月4日

> 今月は、時給対応分だけで、今日の稼働予定分を含めて38時間程度
> 岡部さん 2026年9月30日（記事2本・CMS 登録4本は別）

> 仮サイトを年内リリース…本サイトリリースまでを役務にしたい（仮サイトからの追加追加で課金はなるべくさけたい）
> 佐久間さん 2026年10月8日

> 顧客と最初にスケジュールを組んで、定期的にＭＴＧを行って合意を進めるように体制を整えています…修正お戻し2営業日
> 槻山さん 2026年10月26日（ビットスター宛）

> 今のやり方だと結構制作工数かかるよね という課題があると思うので 例えば今の金額の場合できるのはここまで ここまでやりたければいくら あたりのプランを決めておこうかなと思っております。
> 佐久間さん 2026年10月28日（槻山さん宛）

> 納品早めるのにMTG増えて、調整工数が増えてきました
> 槻山さん 2026年10月28日

このメモの前提
出典はポパー Slack（#サイト制作ディレクション、#bitstar_制作関連、#comirusupport_コミサポβ）2026年5月28日〜10月28日。案件別の稼働記録がないため、時間は工程別の推定と岡部さんの月次申告からの逆算。「10〜12時間」の発言は Slack にないため、高嶌の聞き取りとして扱う。案件管理スプレッドシートは閲覧権限がなく未参照。金額は税抜。
